

工事一時中止に係るガイドライン (案)

沖縄総合事務局開発建設部

このガイドライン(案)は、沖縄総合事務局開発建設部(港湾空港事業を除く)の所掌する工事請負契約に適用するものである。

目次

1. ガイドライン策定の背景

2. 基本フロー

3. 発注者の中止指示義務

4. 工事を中止すべき場合

5. 中止の通知

6. 基本計画書の作成

7. 請負代金額又は工期の変更

- ・請負代金額の変更

- ・工期の変更

8. 増加費用の考え方

- (1) 本体工事施工中に中止した場合

- (2) 契約後準備工着手前に中止した場合

- (3) 準備工期間に中止した場合

9. 増加費用の設計書及び

事務処理上の扱い

- ・設計書における扱い

- ・事務処理上の扱い

参考資料

- ・工事請負契約書(第20条、16条、18条)

- ・増加費用の費目と内容

- ・様式

1. ガイドライン策定の背景

工事発注の基本的考え方

工事の発注に際しては、地元設計協議、工事用地の確保、占用事業者等協議、関係機関協議を整え、適正な工期を確保し、発注を行うことが基本となる。

工事発注の現状

円滑かつ効率的な事業執行を図るため、工事の発注時期の平準化に努めているところであるが、一部の工事で各種協議や工事用地の確保が未完了な場合においてもやむを得ず条件明示を行い、発注を行っている。

現状における課題


各種協議や工事用地の確保が未完了な状態で発注を行った工事や工事の施工途中で請負者の責に帰することができない事由により施工ができなくなった工事については、工事の一時中止の指示を行わなければならない。

しかし、一部の工事において一時中止の指示を行っていない工事も見受けられ、請負者の現場管理費等の増加や配置技術者の専任への支障が生じているといった指摘があるところである。

ガイドライン(案)の策定

これらの課題を踏まえ、受発注者が工事一時中止について、適正な対応を行うためにガイドライン(案)を策定するものである。

2. 工事の一時中止に係る基本フロー

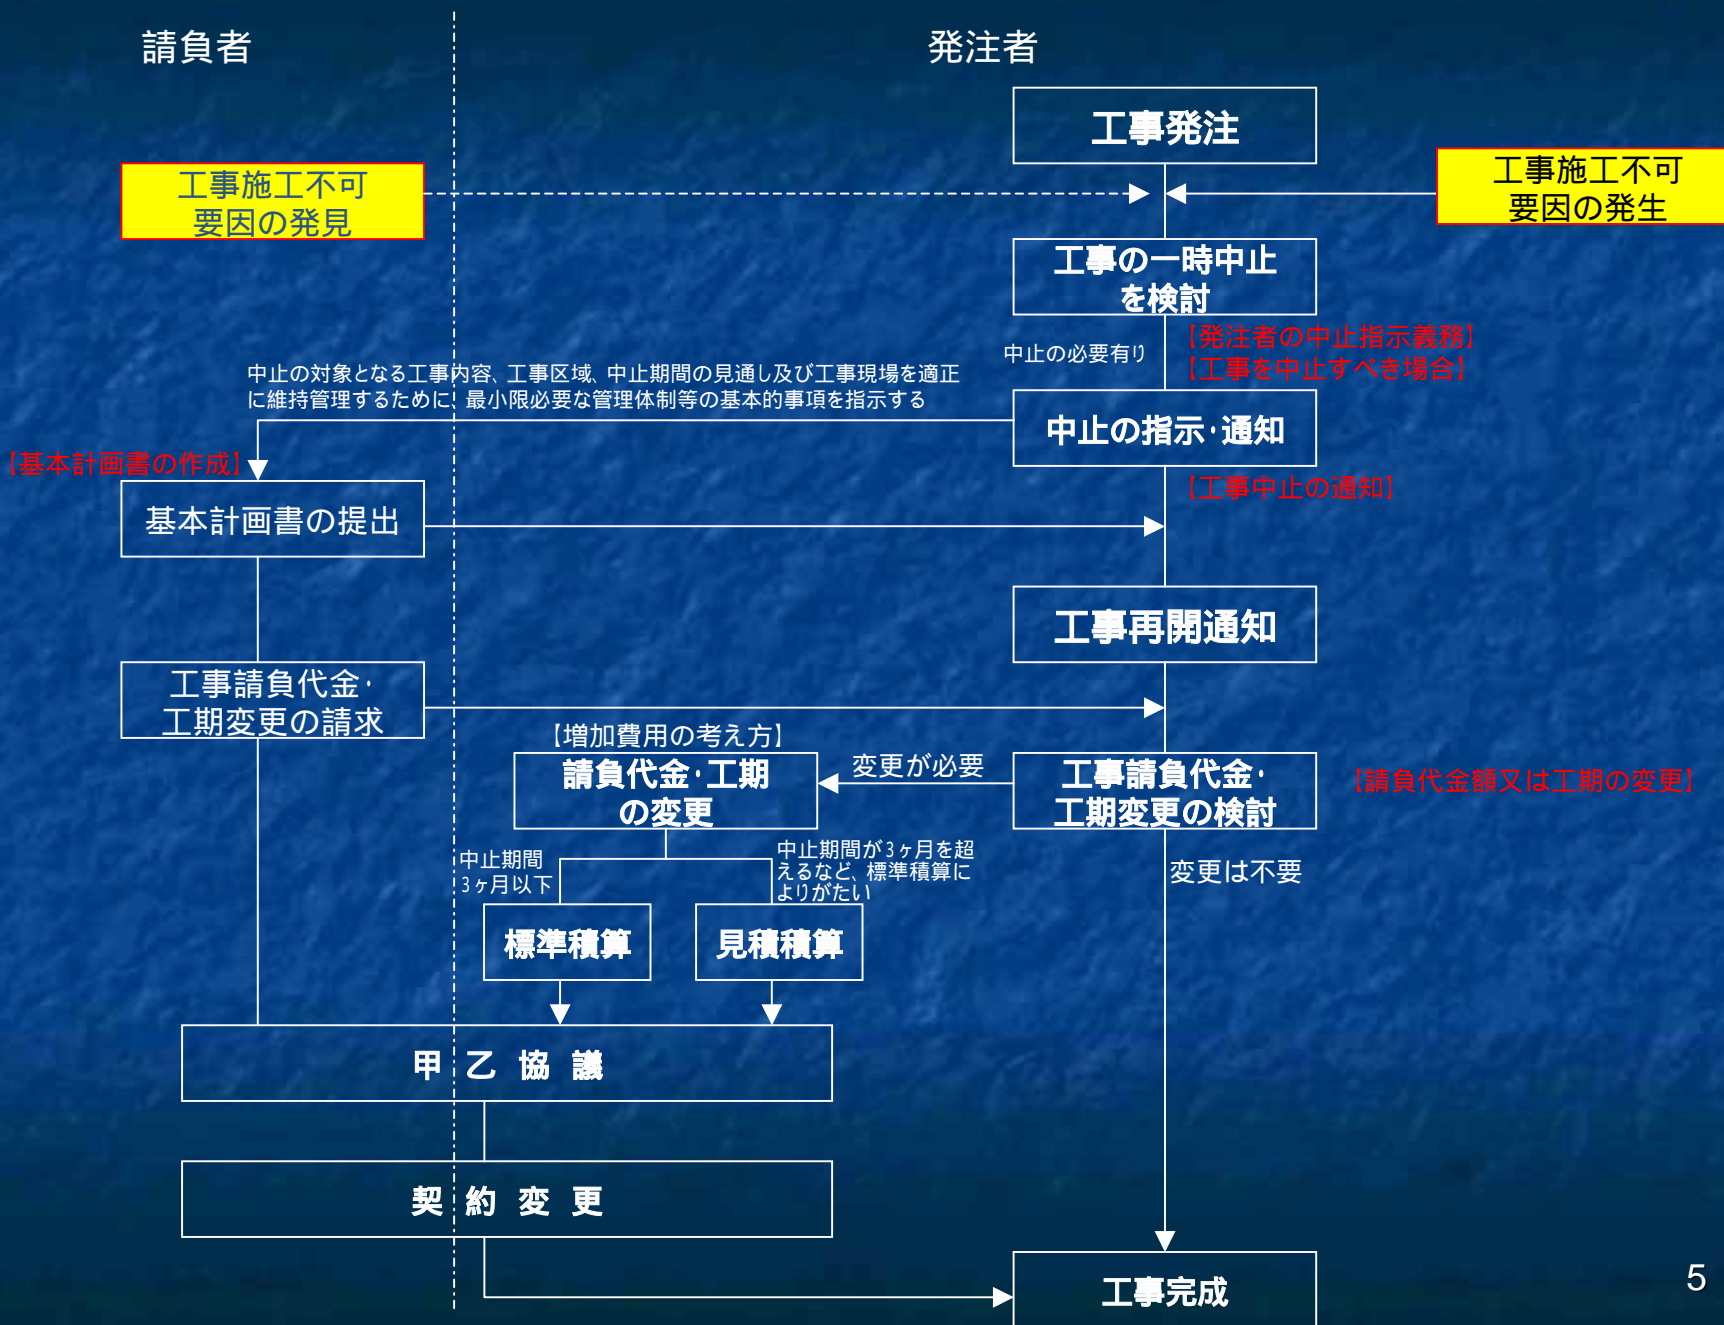

3. 発注者の中止指示義務

請負者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を命じなければならない。【関係法令:契約書第20条】以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。

請負者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合

請負者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる

このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を請負者が負うこととなる

発注者は、工事の中止を請負者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある

工事請負契約書第16条規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する
このことから、発注者及び請負者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる

注) 1 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。

- ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。
- ・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期 となった場合は、技術者の途中交代が認められる。

【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】

大幅な工期延期とは、工事請負契約書(乙の解除権)第48条1項二を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 6 (工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。

4. 工事を中止すべき場合

請負者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、「工事用地等の確保ができない等のため請負者が工事を施工できないと認められるとき」と「暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって請負者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため請負者が工事を施工できないと認められるとき」の2つが規定されている。

【関係法令：契約書第20条】

上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。

一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。

工事用地等の確保ができない等のため
工事を施工できない場合

発注者の義務である工事用地等の確保が行われないため(工事請負契約書第16条) 施工できない場合

設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため(工事請負契約書第18条) 施工を続けることが不可能な場合・・・等

自然的又は人為的な事象のため工事を
施工できない場合

「自然的又は人為的な事象」は、埋蔵文化財の発掘又は調査、反対運動等の妨害活動も含まれる。

「工事現場の状態の変動」は、地形等の物理的な変動だけでなく、妨害活動を行う者による工事現場の占拠や著しい威嚇行為も含まれる

5 . 中止の指示・通知

発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事区域、中止期間の見通し等の中止内容を請負者に通知しなければならない。 【関係法令：契約書第20条】
また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示することとする。

発注者の中止権

発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。

「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断

発注者が工事を中止させることができるのは工事の完成前に限られる。

工事の中止期間

請負者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。

そして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない。

このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、請負者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。

6 . 基本計画書の作成

工事を中止した場合において、請負者は中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。
【土木工事共通仕様書第1編1-1-13】

実際に施工着手する前の施工計画作成中及び測量等の準備期間中であっても、現場の維持・管理は必要であることから基本計画書を提出し、承諾を得ることとする。

記載内容

中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること

中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること

工事現場の維持・管理に関する基本的事項

管理責任

中止した工事現場の管理責任は、請負者に属するものとする。

請負者は、基本計画書において管理責任に係る旨を明らかにする。

7. 請負代金額又は工期の変更

工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期が変更されなければならない。

「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する。

中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。



請負代金額の変更

発注者は、工事の施工を中止させた場合に請負代金額の変更では填補し得ない請負者の増加費用、損害を負担しなければならない。

増加費用

工事用地等を確保しなかった場合
暴風雨の場合など契約の基礎条件の
事情変更により生じたもの

損害の負担

発注者に過失がある場合に生じたもの
事情変更により生じたもの
増加費用と損害は区別しないものとする

工期の変更

工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。

地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。

このことから、取片付け期間や復興に要した期間を含めて工期延期することも可能である。

8. 増加費用の考え方

(1) 本工事施工中に中止した場合

増加費用の範囲

増加費用等の適用は、発注者が工事の一時中止(部分中止により工期延期となった場合を含む)を指示し、それに伴う増加費用等について請負者から請求があった場合に適用する。

増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用とする。

工事現場の維持に要する費用

中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等

中止に係る工事現場の維持等のために必要な請負者の本支店における費用

工事体制の縮小に要する費用

中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者、技術職員の配置転換に要する費用等

工事の再開準備に要する費用

工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等


本工事とは、工事目的物又は仮設に係る工事

増加費用の算定

増加費用の算定は、請負者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など甲乙協議して行う。
増加費用の各構成費目は、原則として、中止期間中に要した費目の内容について積算する。再開以降の工事にかかる増加費用は、従来どおり設計変更で処理する。
一時中止に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。

増加費用等の構成

中止期間中の現場維持等に要する費用を工事原価に含め一般管理費等の対象とする。

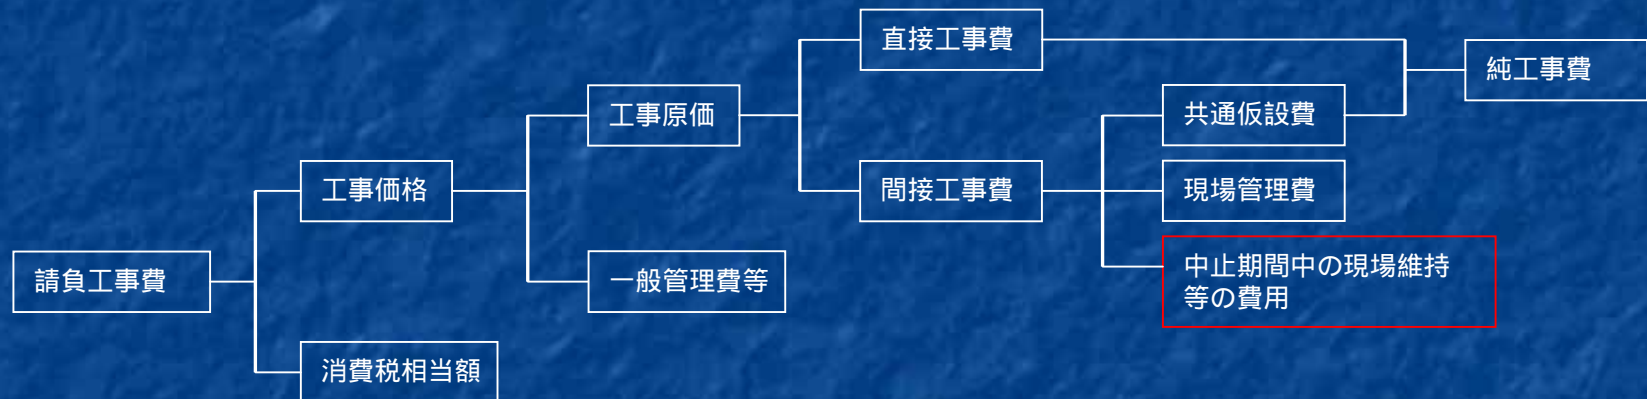

一時中止に伴う本支店における増加費用を含む

標準積算により算定する場合、中止期間中の現場維持等に関する費用として積算する内容は、積上げ項目及び率項目とする。



積上げ項目

直接工事費、仮設費及び事業損失防止施設費における材料費、労務費、水道光熱電力等料金、機械経費で現場維持等に要する費用

直接工事費に計上された材料(期間要素を考慮した材料)及び仮設費に計上された仮設材等の中止期間中に係る損料額及び補修費用

直接工事費(仮設費を含む)及び事業損失防止費における項目で現場維持等に要する費用

率で計上する項目

運搬費の増加費用

現場搬入済みの建設機械の工事現場への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
大型機械類等の現場内小運搬

安全費の増加費用

工事現場の維持に関する費用

保安施設、保安要員の費用及び火薬庫、火工品庫の保安管理に要する費用

役務費の増加費用

仮設費に係る土地の借り上げ等に要する費用、電力及び用水等の基本料金

営繕費の増加費用

現場事務所、労務者宿舍、監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に要する費用

現場管理費の増加費用

現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料手当及び労務管理費等に要する費用

注)・標準積算は工事全体の一時中止(主たる工種の部分中止により工期が延期となった場合を含む)に適用し、道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合、及び一時中止期間が3ヶ月を超える場合は適用不可

・標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上積算とする。

増加費用の積算

増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象^{注)}に算定することとし、算定方法は下記のとおりとする。

ただし、中止期間3ヶ月以下は標準積算により算定し、中止期間が3ヶ月を超える場合、道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合など、標準積算によりがたい場合は、請負者から増加費用に係る見積を求め、甲乙協議を行い増加費用を算定する。

標準積算の適用範囲は、積算基準策定時に検証したケースが3ヶ月程度までであることから、「中止期間3ヶ月以下」としている。見積を求める場合、中止期間全体にかかる見積(例えば中止期間4ヶ月の場合、4ヶ月分の見積)を徴収する。

注) 増加費用の算定(請負代金額の変更)は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する甲乙間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示(用地確保の状況、関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件)を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。

工事一時中止に伴う積算方法(標準積算による場合)

中止期間中の現場維持等の費用(単位円 1,000円未満切り捨て)

$$G = dg \times J +$$

dg : 一時中止に係る現場経費率(単位 % 少数第4位四捨五入3位止め)

J : 対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位 円 1,000円未満切り捨て)

: 積上げ費用(単位 円 1,000円未満切り捨て)

一時中止に係る現場経費率(dg)

$$dg = A \{ (J / (a \times J^b + N))^B - (J / (a \times J^b))^B \}$$

N : 一時中止日数(日)ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数

$A \cdot B \cdot a \cdot b$: 各工種毎に決まる係数(別表-1)

土木工事標準積算基準書における入力項目

J : 一時中止時点の契約上の純工事費

N : 一時中止日数

: 積上げ費用

別表 - 1


工種区分	係数A			係数B	係数a	係数b
	地方部(一般交通等の影響なし)	地方部(一般交通等の影響有) 山間僻地離島	市街地(DID地区・準ずる地区)			
河川工事	616.0	650.8	673.0	-0.2636	0.3687	0.3311
河川・道路構造物工事	150.3	158.8	164.3	-0.1562	0.8251	0.3075
海岸工事	87.9	92.8	96.0	-0.1120	1.6285	0.2498
道路改良工事	282.9	298.9	309.1	-0.1935	0.4461	0.3348
鋼橋架設工事	458.6	484.6	501.1	-0.2612	0.0717	0.4607
PC橋工事	396.9	419.3	433.7	-0.2330	0.8742	0.3058
舗装工事	377.8	399.2	412.8	-0.2108	0.0761	0.4226
共同溝等工事(1)	174.7	184.6	190.9	-0.1448	0.1592	0.4058
共同溝等工事(2)	129.0	136.3	140.9	-0.1153	0.3726	0.3559
トンネル工事	244.8	258.6	267.5	-0.1718	0.0973	0.4252
砂防・地すべり等工事	125.8	132.9	137.4	-0.1379	0.4267	0.3357
道路維持工事	80.0	84.5	87.4	-0.0926	0.1699	0.3933
河川維持工事	366.0	386.7	399.9	-0.2138	0.0144	0.5544
下水道工事(1)	364.6	385.3	398.4	-0.2054	0.0812	0.4356
下水道工事(2)	112.7	119.1	123.2	-0.1089	0.2598	0.3771
下水道工事(3)	88.7	93.8	96.9	-0.1078	0.5988	0.3258
公園工事	203.6	215.1	222.5	-0.1733	0.2026	0.3740
コンクリートダム工事	293.2	309.8	320.4	-0.1793	11.6225	0.1998
フィルダム工事	423.4	447.4	462.6	-0.2055	0.0617	0.4440
電線共同溝工事	214.1	226.2	234.0	-0.1615	8.1264	0.1740

地域補正: 地方部(一般交通等の影響なし)
 地方部(一般交通等の影響有)、山間僻地離島
 市街地(DID地区・準ずる地区)

(2) 契約後準備工着手前に中止した場合

契約後準備工着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、材料等が未手配の状態での測量等の準備工に着手するまでの期間をいう。

発注者は、上記の期間中に、準備工又は本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を請負者に通知する。

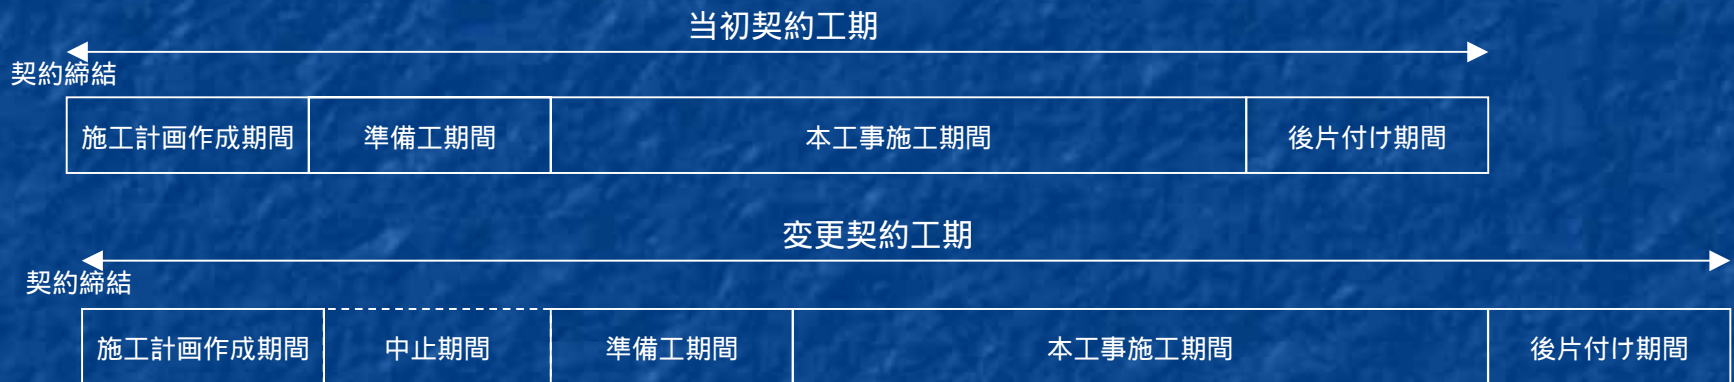

基本計画書の作成

工事請負契約書の工事用地の確保等第16条2項に「乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない」とある。

このことから、請負者は必要に応じて、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。


増加費用

一時中止に伴う増加費用は計上しない。

(3) 準備工期間に中止した場合

準備工期間とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板を設置し、測量等の本工事施工前の準備期間をいう。

発注者は、上記の期間中に、本体工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時中止を請負者に通知する。

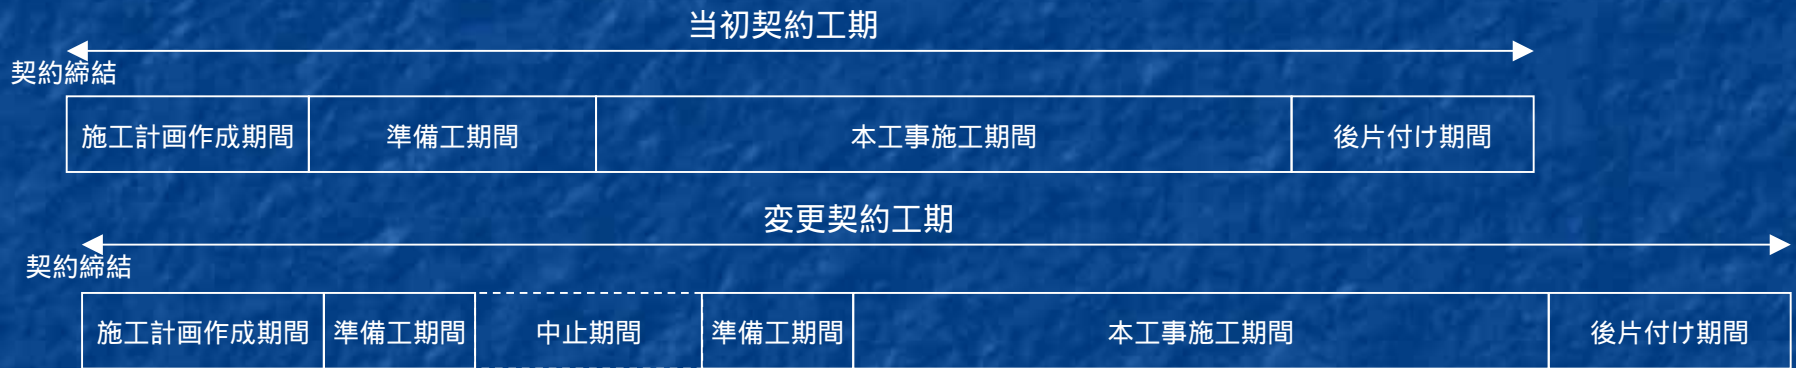

基本計画書の作成

請負者は、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書を発注者に提出し承諾を得る。

増加費用

増加費用の適用は、請負者から請求があった場合に適用する。

増加費用は、安全費(工事看板の損料)、営繕費(現場事務所の維持費、土地の借地料)及び現場管理費(監理技術者もしくは主任技術者、現場代理人等の現場従業員手当)等が想定される。

増加費用の算定は、請負者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の「明細書」に基づき、費用の必要性・数量など発注者・請負者が協議して決定する。(積算は請負者から見積を求め行う。)

9. 増加費用の設計書及び事務処理上の扱い

増加費用の設計書における取扱い

増し分費用は、中止した工事の設計書の中に「中止期間中の現場維持等の費用」として原契約の請負工事費とは別計上する。

ただし、設計書上では、原契約に係る請負工事費と増し分費用の合算額を請負工事費とみなす。

増加費用の事務処理上の取扱い

増し分費用は、原契約と同一の予算費目をもって、設計変更の例にならない、更改契約するものとする。

増し分費用は、乙の請求があった場合に負担する

増し分費用の積算は、工事再開後速やかに甲乙が協議して行う。

工事請負契約書

工事請負契約書 第20条(工事の中止)

1. 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことがないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2. 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の一時中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3. 甲は、前2項の規定により工事の施工を一部中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

工事請負契約書 第16条(工事用地の確保等)

1. 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2. 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3. 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4. 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5. 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。

工事請負契約書 第18条(条件変更等)

1. 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事案を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
 - 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
 - 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること
 - 三 設計図書の表示が明確でないこと
 - 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
 - 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2. 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3. 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4. 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
 - 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの。 甲が行う。
 - 二 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの。 甲が行う。
 - 三 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの。 甲乙協議して甲が行う。
5. 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

工事請負契約書 第48条(乙の解除権)

1. 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
 - 一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
 - 二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
 - 三 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2. 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を甲に請求することができる。

増加費用の費目と内容

増加費用の費目と内容

増し分費用の各費目に待る積算の内容は次のとおりとする。

(1)現場における増し分費用

イ 材料費

材料の保管費用

工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、甲が倉庫等(乙が工事現場に設置したものを除く。)へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料

他の工事現場へ転用する材料の運搬費

工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、甲が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費

直接工事費に計上された材料の損料等

元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の中止期間に係る損料額及び補修費用

ロ 労務費

工事現場の維持等に必要な労務費

中止後の労務費は、原則として計上しない。

ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、甲乙協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用

他職種に転用した場合の労務費差額

工事現場の保安等のために、甲乙協議により工事現場に常駐させた、トンネル、潜函工などの特殊技能労務者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事した職種の甲の設計上の単価差額の費用

ハ 水道光熱電力等料金

工事現場に設置済の施設を工事現場の維持等のため、甲が指示し、あるいは甲乙協議により中止期間中稼動(維持)させるために要する水道光熱電力等に要する費用

ニ 機械経費

工事現場に存置する機械の費用

現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用

- a 工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費(組立て、解体費を含む。)が存置する費用を上回ること等により、甲が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用(組立て・解体費、管理費を含む。)
- b 甲が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用

ホ 運搬費

工事現場外への搬出又は工事現場への再投入に要する費用

中止時点で現場搬入済の機

械器具類及び仮設材等のうち甲が元設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用

大型機械類等の現場内運搬

元設計に計上した機械類、資材等のうち、工事が中止されたために、新たに工事現場内を移動させることを甲が指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めた大型の機械、材料、仮設物等の運搬費用

ヘ 準備費

別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の跡かたづけ、再開準備のために諸準備・測量等で、甲が指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めたものに係る準備費用

ト 仮設費

仮設諸機材の損料

現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用

新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用

元設計には計上されていないが、中止に伴う工事現場の維持等の必要上、甲が新たに指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めた仮設等に要する費用(補助労力・保安要員費を含む。)

チ 事業損失防止施設費

仮設費に準じて積算した費用

リ 安全費

既存の安全設備に係る費用

中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の中止期間に係る損料及び維持補修の費用

新たな工事現場の維持等に要する安全費

元設計には計上されていないが、中止に伴い、工事現場の安全を確保するため、甲が新たに指示しあるいは甲乙協議により甲が必要と認めた安全管理に要する費用(保安要員費を含む。)

ヌ 役務費

プラント敷地、材料置場等由敷地の借上げ料

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用

電力水道等の基本料

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る中止期間中の基本料

ル 技術管理費

原則として増し分費用は計上しないものとする。

ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用

ヲ 営繕費

中止以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額又は営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における中止期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用

ワ 労務者輸送費

元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において甲乙協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用

カ 社員等従業員給料手当

中止期間中の工事現場の維持等のために、甲乙協議により定めた次の費用

元請・下請会社の現場常駐の従業員(機械、電気設備の保安に係るものを含む。)に支給する給料手当の費用

中止時点で現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用

工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員に支給する給料手当の費用

ヨ 労務管理費

他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用

中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者(通勤者も含む。)を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが貸金台帳等で確認できるような者(以下「専従的労務者」という。)(通勤者も含む。)とする。

解雇・休業手当を払う場合の費用

甲乙協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用

タ 地代

現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用

レ 福利厚生費等

現場管理費の内、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交通費として現

場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用

(2) 本支店における増し分費用

中止に係る工事現場の維持等のために必要な乙の本支店における費用

(3) 消費税相当額

現場及び本支店における増し分費用に係る消費税に相当する費用

工事の一時中止に係る手続き様式(参考様式)

別記様式第1

(参考様式)

平成 年 月 日	
請負者	
氏 名 殿	
	契約担当官等
	官職・氏 名 印
工事〇〇一時中止通知書	
工事名 _____	
平成 年 月 日付け貴社と契約締結した上記工事について、当局の都合により工事の施工を〇〇一時中止してください。	
なお、中止箇所等については下記のとおりです。	
記	
1	中止箇所及び工種
2	中止期間
3	再開後の工期 再開時に協議

〔注〕

- (1) 〇〇の箇所には次のように記入すること。
 - (イ) 全面中止の場合……………「全面」
 - (ロ) 一部中止の場合……………「一部」
 - (2) 印は契約担当官等の官印を押印すること。
 - (3) 中止期間については
「平成 年 月 日から平成 年 月 日まで」と記入すること。
ただし、中止期間の設定が困難なものについては、「平成 年 月 日」から再開を指示する日まで（平成 年 月 日の予定）と記入すること。
 - (4) 用紙の大きさは日本工業規格A列4縦とする。
- ※ 以下各様式記入方法も同様とする。

別記様式第2 (参考様式)

		平成 年 月 日
請負者		
氏 名 殿		
	契約担当官等	
	官職・氏 名 印	
工 事 再 開 通 知 書		
工事名 _____		
平成 年 月 日付で〇〇一時中止した上記工事について、下記により再開してください。		
記		
1 再開する日	平成 年 月 日	
2 再開箇所及び工種		
3 再開後の工期	前契約書のとおり	
4 その他		

〔注〕

- (1) 中止箇所の一部のみを再開する場合は、3の再開後の工期の欄には、「全面再開時に協議」と記入すること。
- (2) 4のその他の欄には、再開にともなう注意事項、指示事項等を記入すること。
(以下各様式記入方法も同様とする。)

		平成	年	月	日	
請負者						
氏名	殿					
		契約担当官等				
		官職・氏名	印			
工事再開通知及び契約変更協議書						
工事名 _____						
平成 年 月 日付けで〇〇一時中止した上記工事について、下記により〇〇再開してください。						
なお、上記工事契約書の一部を変更したいので、契約書第17条にもとづき、下記のとおり協議します。						
承諾のうえは、別紙変更契約書に記名押印のうえ 部提出してください。						
記						
1	再開する日	平成	年	月	日	
2	再開箇所及び工種					
3	契約変更の事項	工期変更	平成	年	月	日
4	その他					

〔注〕

- (1) 本様式は契約金額を変更する場合は使用しない。
- (2) 構造・工法等を変更して再開する場合は再開通知をし、同日付で所定の書式（契約変更等協議書）により処理すること。

平成 年 月 日	
請負者	
氏 名 殿	
	契約担当官等
	官職・氏 名 団
工事中止の延長通知及び契約変更協議書	
工事名 _____	
平成 年 月 日付で〇〇一時中止した上記工事について、下記のとおり中止期間を延長したいので、契約書第17条にもとづき協議します。	
なお、承諾のうえは、別紙変更契約書案に記名押印のうえ 部提出してください。	
記	
1 中止期間	
2 契約変更の事項	工期変更 平成 年 月 日
3 そ の 他	前中止通知書に同じ

〔注〕

本様式は、延長の中止期間が契約書で定めた工期を超えるときに使用する。

(参考様式)

		平成	年	月	日
契約担当官等					
官職・氏	名	殿			
監督職員等					
官職・氏	名	印			
工事〇〇一時中止について（上申）					
工事名 _____					
上記工事について、下記のとおり〇〇一時中止したいので上申する。					
記					
1	中止期間				
2	中止箇所及び工種				
3	中止理由				
4	その他				

〔注〕

- (1) 中止理由は詳細に記入すること。
- (2) 上申する場合の添付書類は平面図（中止個書を朱書）2部とすること。
- (3) 「印」は監督職員の私印を押印すること。
（以下各様式記入方法も同様とする。）

平成 年 月 日	
契約担当官等	
官職・氏 名 殿	
	監督職員等
	官職・氏 名 印
工事再開について(上申)	
工事名 _____	
平成 年 月 日付けで〇〇一時中止した上記工事について、下記のとおり再開したいので上申する。	
記	
1 再開年月日	平成 年 月 日
2 再開箇所及び工種	
3 再開理由	
4 再開後の工期	

〔注〕

- (1) 再開理由は詳細に記入すること。
- (2) 上申する場合の添付書類は平面図(再開箇所を朱書)2部とすること。
- (3) 中止箇所の一部のみを再開する場合は、4の再開後の工期の欄には、「前面再開時に協議」と記入すること。
- (4) 再開にともなって工期変更をする場合は、4の再開後の工期の欄に延長年月日を記入すること。
- (5) 再開にともなって工期変更をしない場合は「前契約書のとおり」と記入すること。

		平成	年	月	日
契約担当官等					
官職・氏	名	殿			
監督職員等					
官職・氏	名	◎			
工事一時中止の延長について（上申）					
工事名 _____					
平成 年 月 日付け〇〇一時中止した上記工事について、下記のとおり中止期間を延長したいので上申する。					
記					
1	中止期間				
2	中止箇所及び工種				
3	延長理由				
4	その他				

〔注〕

- (1) 中止期間が契約書で定めた工期を超えることが明らかになった時に、ただちに上申する。
- (2) 中止期間について
「平成 年 月 日から平成 年 月 日まで」と記入する。
- (3) 延長理由を詳細に記入すること。

		平成	年	月	日
契約担当官等					
官職・氏	名	殿			
監督職員等					
官職・氏	名	印			
工事一時中止の延長について（報告）					
工事名 _____					
平成 年 月 日付け〇〇一時中止した上記工事について、下記のとおり中止期間を延長し、請負者あて通知したので報告する。					
記					
1	中止期間				
2	中止箇所及び工種				
3	延長理由				
4	その他				

〔注〕

本様式は、延長の中止期間が契約書で定めた工期を超えないもので監督職員の口頭通知により処理したものに使用する。

(参考様式)

平成 年 月 日

契約担当官等 殿

請 負 者 印

工事一時中止に伴う工事現場の維持、管理 等に関する基本計画書について

工 事 名

平成 年 月 日付けで工事一時中止の通知があった標記工事について、別紙のとおり基本計画を提出します。

別 紙

基本計画書

- 1 中止時点における内容
 - (1) 中止する工種の出来高
 - (2) 職員の体制
 - (3) 労務者数
 - (4) 搬入材料
 - (5) 建設機械器具等
- 2 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること。
- 3 中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること。
- 4 中止した工事現場の管理責任に関すること。
